**УТВЪРЖДАВАМ:**
**ДИРЕКТОР.....**
*инж. Венцислав Николов*

## РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙНОВ РАЙОН

| Съдържание на ПУРБ / Задачи | Начален срок | Краен срок | Коментар |
|---|---|---|---|
| **Раздел 1. Общо описание на характеристиките на района за басейново управление (съгласно Глава X, Раздел VI, чл.157 ал.1 и Раздел IV от ЗВ)** | | | |
| ***1.1. Общи характеристики*** | | | |
| 1.1.1. Географски граници и екорегиони. Характерни особености на района за басейново управление | март, 2013 | септември, 2014 | Определени и докладвани през 2004 г., актуализирани през 2009 г. и докладвани през 2010 г. Предстои допълване и валидиране на характерните особености на района. |
| 1.1.2. Идентифициране на значимите проблеми в управлението на водите в района за басейново управление в периода на прилагане на първия ПУРБ | май, 2013 | декември, 2013 | За изпълнението на дейността ще се ползват рез. от д-сти по Раздел 2. Информацията се предоставя на обществеността, най-малко две години преди началото на периода, за който се отнася |
| 1.1.3. Предоставяне на информация на широката общественост за идентифицираните значими проблеми в управлението на водите | януари, 2014 | юни, 2014 | съгл. Чл.168в, ал.1 от ЗВ, информацията по т.1.1.2. се предоставя на обществеността за становища в срок от 6 мес. |
| ***1.2.Характеристика на повърхностните води*** | | | |
| 1.2.1. Валидиране на границите между отделните типове повърхностни води от категории "реки", "езера" и "преходни води", актуализация на типовете и границите на ВТ | януари, 2013 | юли, 2014 | Предвижда се изпълнението на дейността да се извърши по проект по ОПОС. |
| 1.2.2. Оценка на хидроморфологичното състояние на вътрешните повърхностни води от категории "реки", "езера" и "преходни води" и определяне на въздействието върху екологичното състояние от хидроморфологични изменения. | март, 2013 | ноември, 2014 | Предвижда се изпълнението на дейността да се извърши по проект по ОПОС. |
| 1.2.3. Завършване на разработването, процес на валидиране на класификационната система оценка на екологичното състояние и екологичния потенциал на определените типове повърхностни води от категории "реки", "езера" и "преходни води". Определяне на референтни условия , разработване на класификационна система за преходни води. | януари, 2013 | декември, 2014 | През 2011 г. и 2012 г. са възложени и реализирани I-ви и II-ри етап от необходимите проучвания за валидиране на определените референтни условия в Черноморския басейнов район |
| 1.2.4. Актуализация на типологията, референтните условия и класификационната система. Оценка на хидроморфологичното състояние на крайбрежните морски води | януари 2013 | юли, 2014 | Предвижда се изпълнението на дейността да се извърши по проект по ОПОС. |
| 1.2.6. Завършване на интеркалибрацията на общите типове повърхностни водни тела | януари, 2013 | декември, 2015 | |
| ***1.3. Характеристика на подземните води*** | януари, 2013 | октомври, 2014 | Дейността ще се извърши от БД |
| **Раздел 2. Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води (съгласно Глава X, Раздел VI, чл.157 ал.1, т .2)** | | | |
| ***2.1. Оценка на замърсяването от точкови източници (съгласно Раздел VI, чл.157, ал.1, т. 2 "а")*** | януари 2013 | октомври, 2014 | При изпълнението на дейността ще се ползват резултати от проучвания. |
| ***2.2. Оценка на замърсяването от дифузни източници, включително преглед на ползването на земите (съгласно Раздел VI, чл.157, ал.1, т. 2 "б")*** | януари 2013 | август, 2014 | Предвижда се изпълнението на дейността да се извърши по проект по ОПОС. |
| ***2.3. Оценка на въздействието върху количеството на водите, включително водовземанията (съгласно РазделVI, чл.157, ал.1, т. 2 "в")*** | януари 2013 | август, 2014 | При изпълнението на дейността ще се ползват резултати от проучвания. |
| ***2.4. Анализ на други въздействия в резултат на човешката дейност върху състоянието на водите (съгласно Раздел VI, чл.157, ал.1, т. 2 "г")*** | януари, 2013 | юли, 2014 | При изпълнението на дейността ще се ползват резултати от проучвания. |
| ***2.5. Оценка на риска за водните тела, за непостигане на поставените цели за опазване на околната средата (съгласно Раздел IV, чл. 156 "к")*** | април, 2013 | юни, 2014 | Дейността ще се извърши от БД |

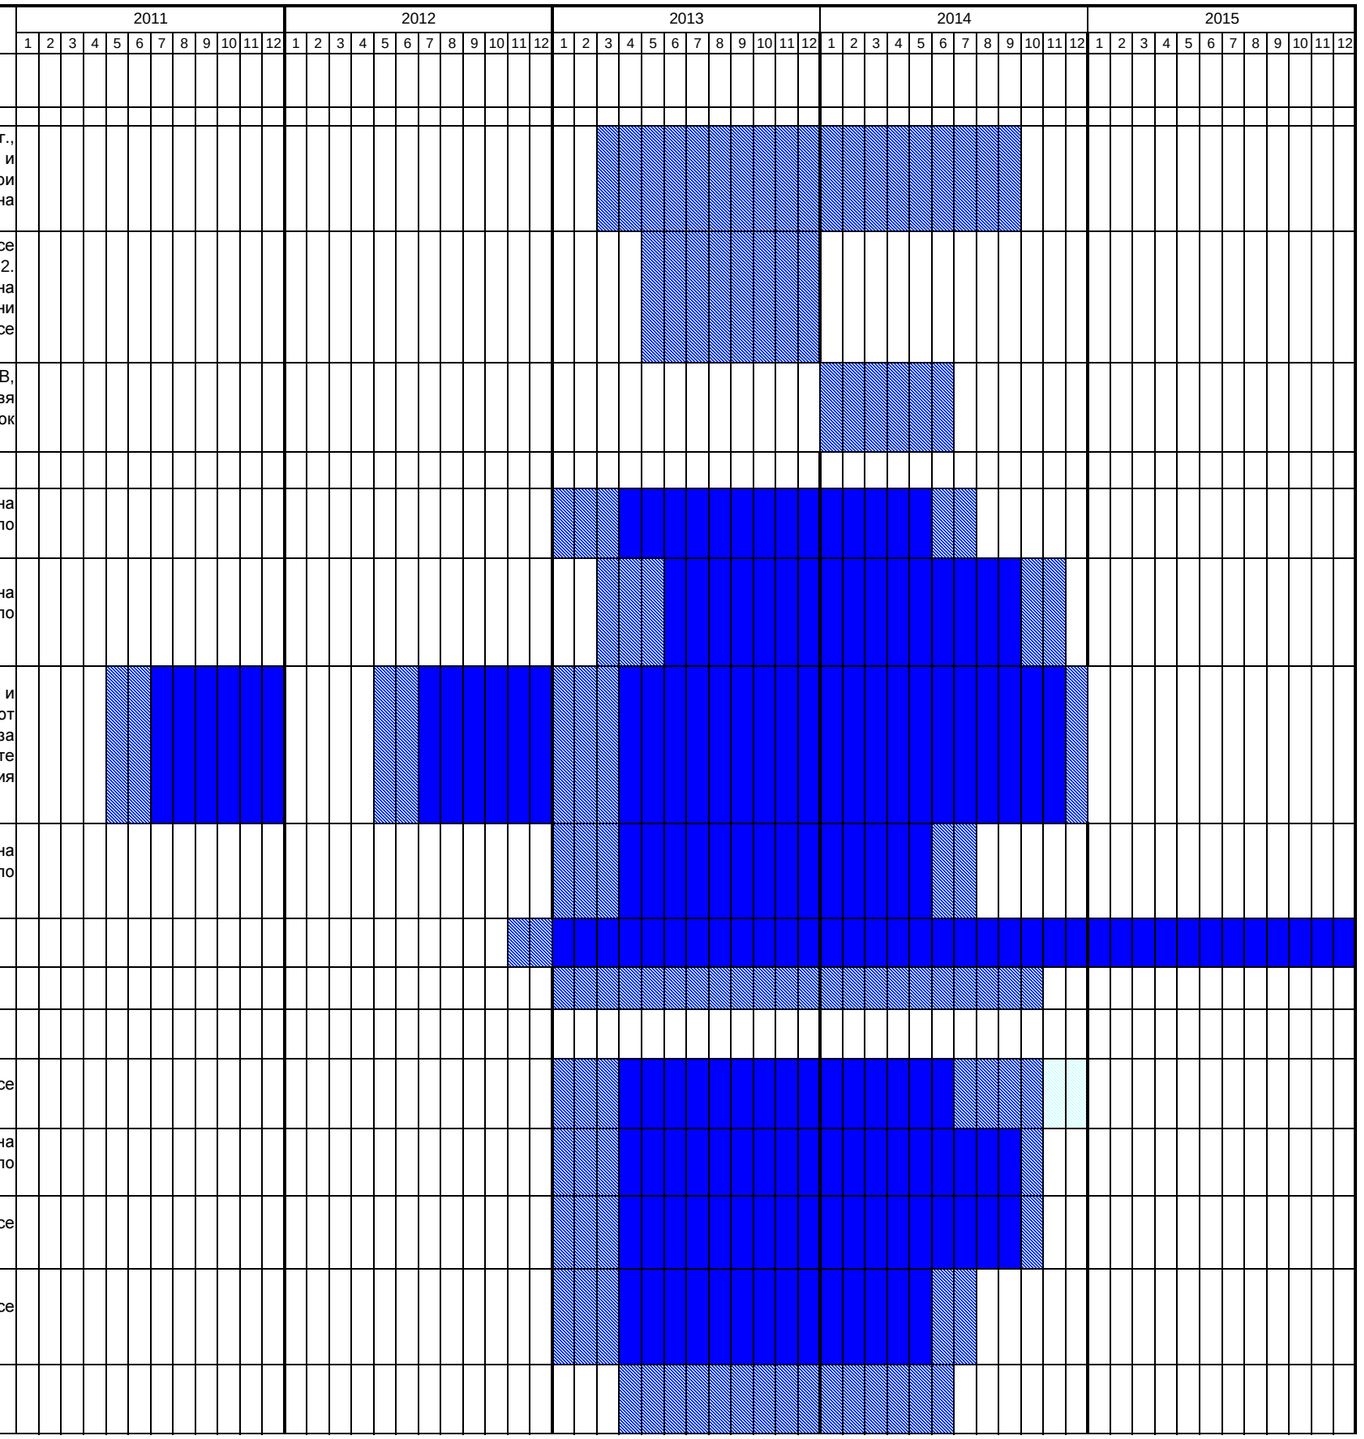

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Раздел 3. Списък и карти на зоните за защита на водите - регистър на защитените територии, актуализация (съгласно Раздел VI, чл.157 т.3)** | | | |
| 3.1. Актуализация на регистъра на защитените територии | постоянен | постоянен | БД поддържа и актуализира ежемесечно регистри на зоните за защита на водите. |
| **Раздел 4. Актуализация на програмите за мониторинг на водите** | | | |
| 4.1. Програми за контролен и оперативен мониторинг на повърхностните води, подземните води и на зоните за защита на водите. Изготвяне на карти с мрежите и карти с резултатите от мониторинга (съгласно Раздел VI, чл.157, ал. 1, т.4 и т.5) | юни, 2014 | октомври, 2014 | За изпълнение на дейността ще се ползват резултати от д-сти по Раздел 2 и д-ст 7.1 |
| **Раздел 5. Ревизия на целите за опазване на околната среда за повърхностните и подземните водни тела и на зоните за защита на водите , включително случаите по чл.156 "в" - 156 "е" (съгласно Раздел VI, чл.157, ал. 1, т.6)** | | | |
| 5.1. Ревизия на целите за опазване на околната среда | януари, 2014 | юни, 2014 | Дейността ще се извърши от БД. За изпълнение на дейността ще се ползват резултати от д-ст 7.1. |
| **Раздел 6. Актуализация на икономическия анализ на водоползването (съгласно Раздел VI, чл. 157, ал. 1, т. 7)** | | | |
| 6.1. Актуализация на икономическия анализ на водоползването | януари, 2013 | декември, 2013 | Дейността ще се извърши в два етапа: I етап - по проект по ОПОС ; II етап - от БД. За изпълнение на деиностите ще се ползват резултати от д-ст 2.3. |
| **Раздел 7. Ревизия и актуализация на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда (съгласно Раздел VI, чл.157 т.8)** | | | |
| 7.1. Оценка на ефекта от изпълнението на мерките в първия ПУРБ. | септември, 2013 | април, 2014 | За изпълнение на дейността ще се ползват резултати от изпълнени дейности от Раздел 2 и Раздел 4 |
| 7.2. Разработване на национален каталог от мерки с включени единични цени и очакван социално-икономически ефект | март, 2013 | август, 2014 | Дейността ще се извърши в два етапа: I етап - от БД; II етап - по проект по ОПОС |
| 7.3. Наблюдение и контрол на изпълнението на Програмата от мерки към ПУРБ в т.ч. контрол по ЕО | постоянен | постоянен | Дейността се извършва ежегодно от БД. |
| 7.4. Актуализация на прогамата от мерки | януари, 2013 | октомври, 2014 | Дейността ще се извърши в два етапа: I етап - по проект по ОПОС ; II етап - от БД. ПоМ ще бъде допълнена след прикл.на д-ст 9.1. и ЕО |
| 7.5. Анализ на икономическата ефективност на Програмите от мерки. Източници на финансиране и институционален анализ на програмита от мерки и разработване на график за прилагането им. | септември, 2014 | декември, 2014 | Дейността ще се извърши от БД. За изпълнение на дейностите ще се ползват резултати от д-ст 7.2.и 7.4 |
| **Раздел 8. Актуализация на регистъра на всички други подробни програми и планове в обхвата на Черноморския район за БУ, отнасящи се за отделни подбасейни, сектори, проблеми или типове води, имащи отношение към ПУРБ (съгласно Раздел VI, чл.157, ал. 1, т.9)** | | | |
| 8.1. Актуализация на регистъра на всички други подробни програми и планове в обхвата на Черноморския район за БУ, имащи отношение към ПУРБ | постоянен | постоянен | БД поддържа и актуализира ежемесечно регистъра по чл.157, ал.1, т.9 |
| **Раздел 9. Списък на мерките за обсъждане с обществеността, постигнатите резултати при изпълнението им и свързаните с това изменения на плана (съгласно Раздел VI, чл.157, ал. 1, т.10)** | | | |
| 9.1. Списък на мерките за обсъждане със заинтересованите страни. | май, 2014 | декември, 2014 | За изготвяне на списъка ще се ползват резултатите от д-ст 7.4. и 7.5. |
| 9.1. Публикуване и предоставяне на проекта на ПУРБ за коментари от широката общественост и заинтересованите страни | януари, 2015 | юни, 2015 | Дейността ще се извърши от БД. Съгл. Чл.168в, ал.1 от ЗВ, информацията се предоставя на обществеността за становища в срок от 6 мес. |
| **<u>Приемане на ПУРБ</u>** | | | |
| Екологична оценка на ПУРБ и ОС | септември 2014 | март 2015 | Предвижда се изпълнението на дейността да се извърши по проект по ОПОС. |
| Утвърждаване от Басейнов съвет и Висш Консултативен Съвет | | | |
| Утвърждаване от министъра на околната среда и водитет | | | |

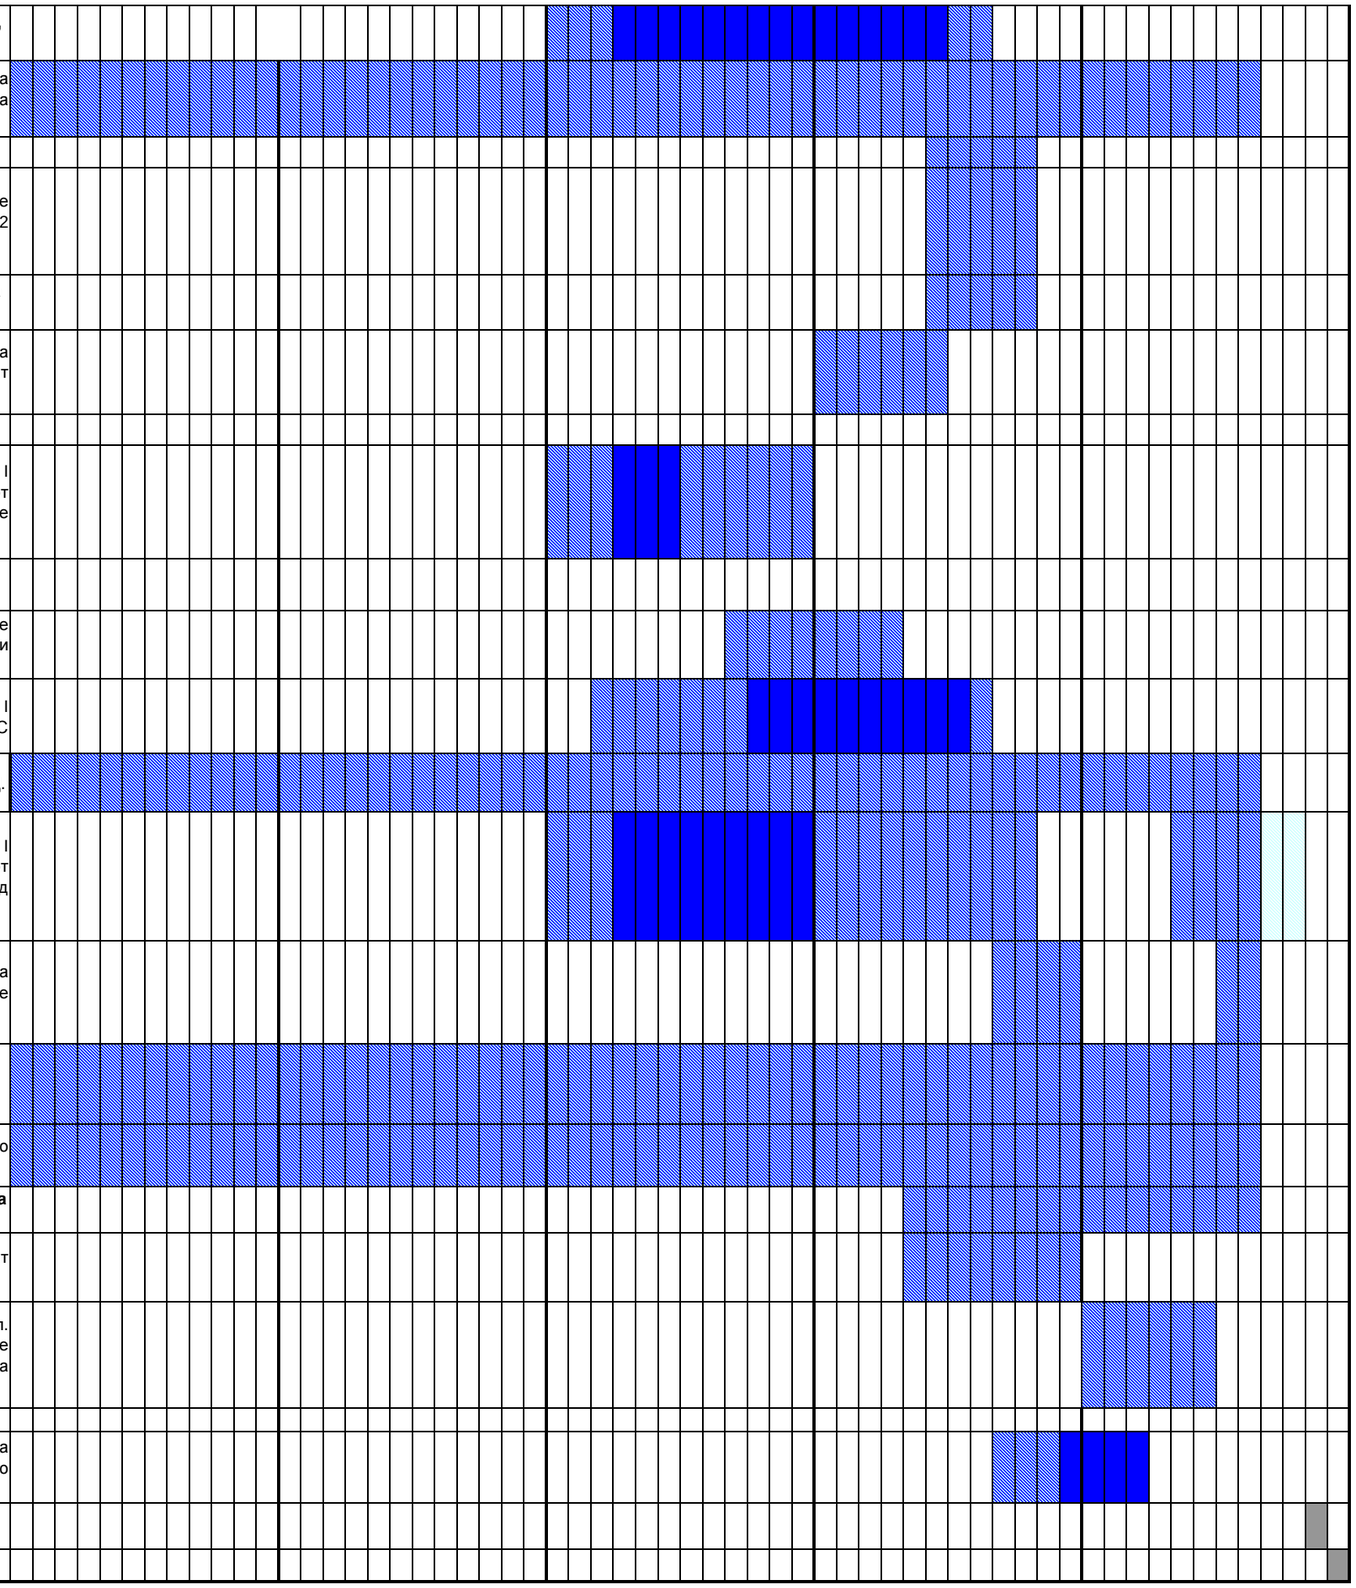

**Легенда:**
БД - възлагане
БД - изпълнение

Изготвил: Т. Милкова
Съгласували: С. Пенчева
Д.Консулова
